

Gmina Grybów

„Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kąclowa wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej – etap I”

Zadanie współfinansowane ze środków:

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 5 „Ochrona środowiska, Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych, Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne







BENEFICJENT PROJEKTU

Gmina Grybów

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT

Zakład Wodociągów i Kanalizacji



„Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kąclowa wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej – etap I”

- **06.03.2015** podpisanie umowy na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kąclowa – projekt wykonała Firma „PROSPIN” Przedsiębiorstwo Doradztwa, Projektowania i Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. z Krakw za kwotę **125 460,00** zł.
- **26.02.2016** podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w aglomeracji Grybów obejmującej miejscowości Kąclowa, Binczarowa, Florynka – projekt w opracowaniu przez firmę HTS Sp. z o.o. z Rzeszowa za kwotę **429.270,00** zł.
- **27.09.2017** Gmina Grybów podpisała z Zarządem Województwa Małopolskiego umowę na dofinansowanie projektu.
- ❖ całkowity koszt projektu: **20 000 000,00** zł
- ❖ wydatki kwalifikowane: **14 006 625,31** zł
- ❖ kwota dofinansowania: **8 000 000,00** zł

BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW KĄCŁOWA – KONTRAKT 1 ROZPOCZĘCIE PRAC

- **2017-11-24 r** ogłoszenie przetargu dla zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kąclowa”
- **07.02.2018 r.** podpisanie umowy z Firmą Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego „MACHNIK” z Krynicy-Zdrój za kwotę 9.800.000,00 zł



UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE PRAC



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



























PARA BUCH KOŁA W RUCH















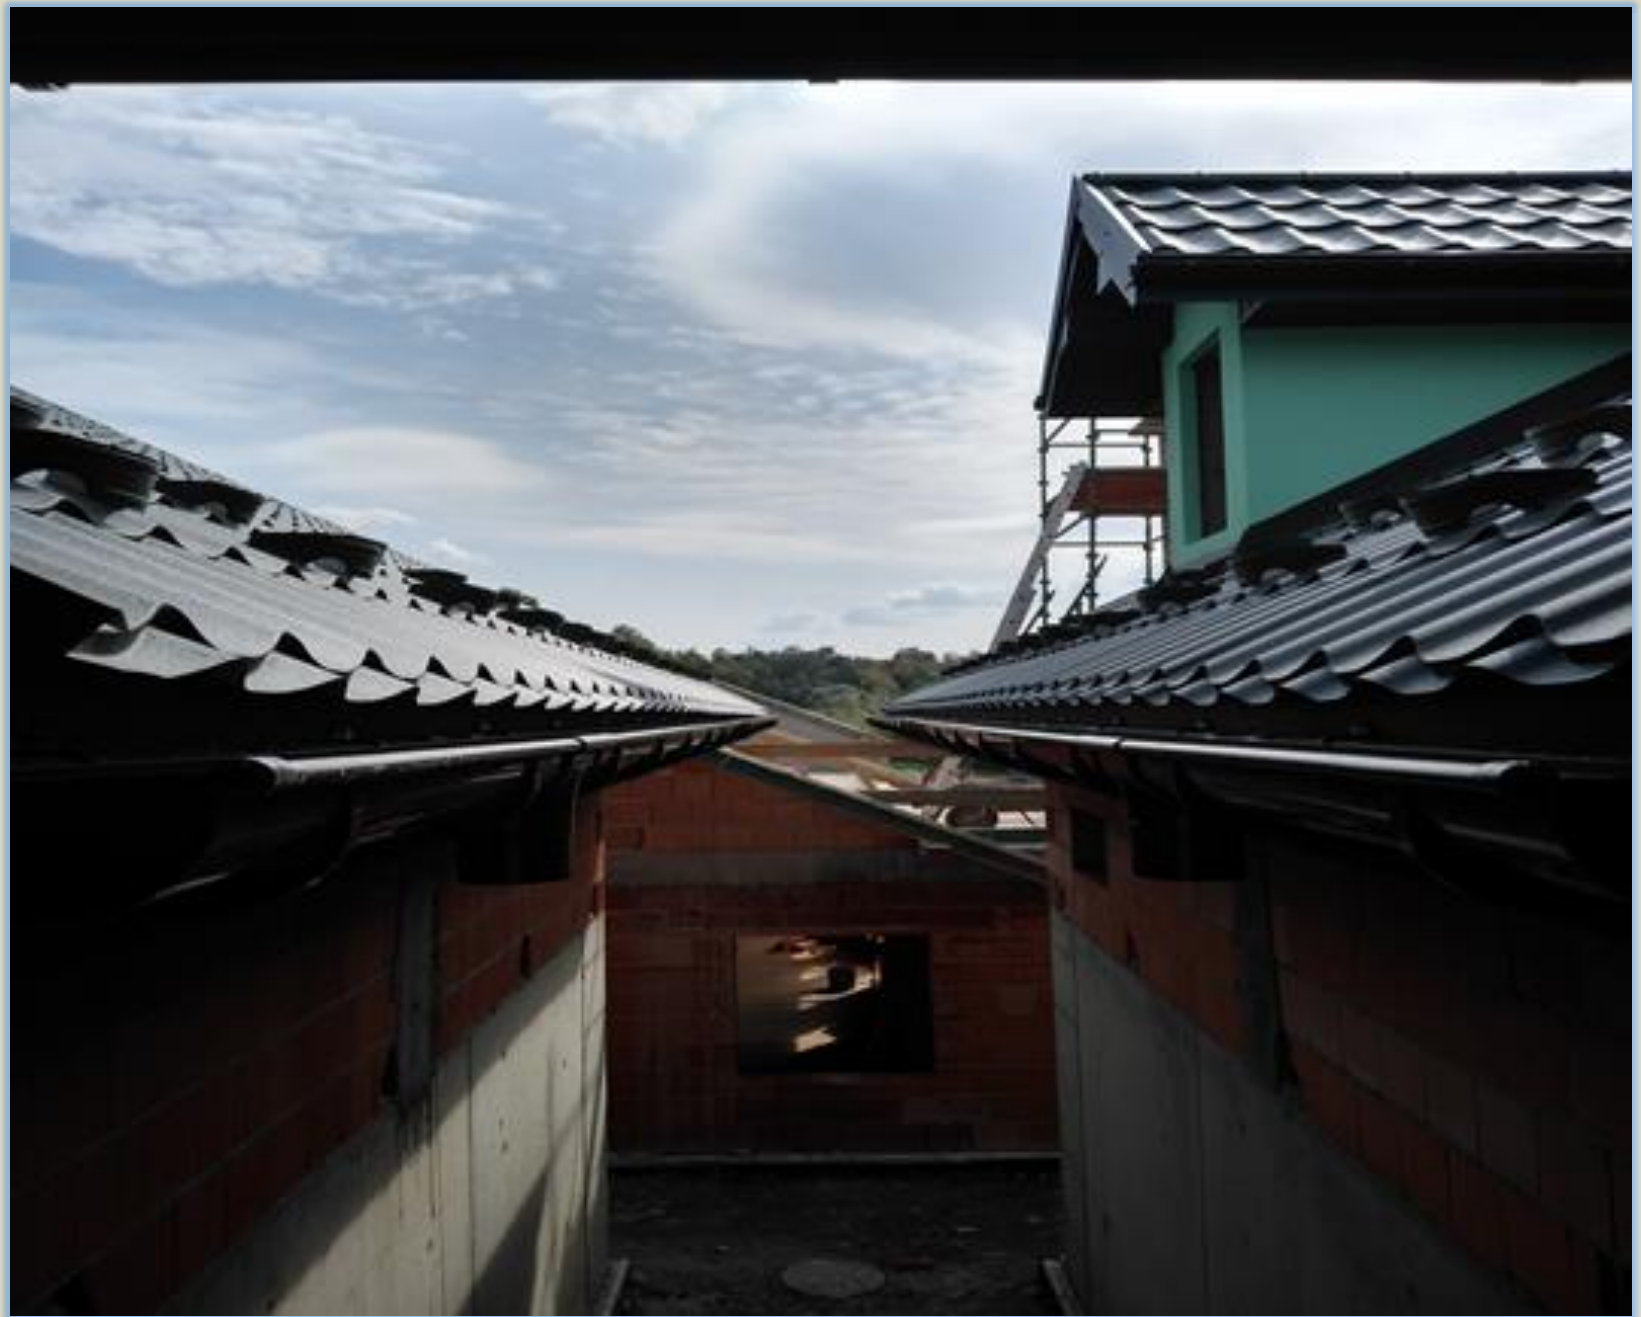



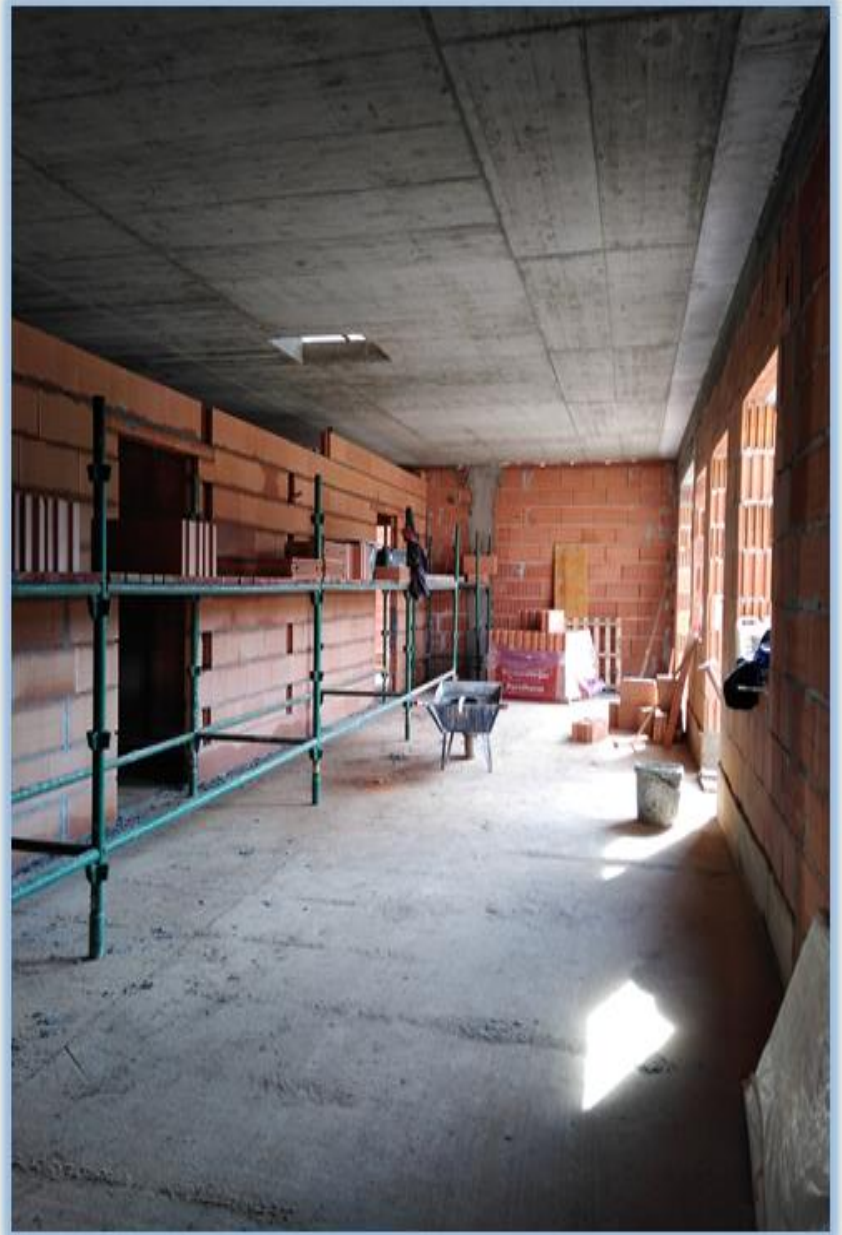


















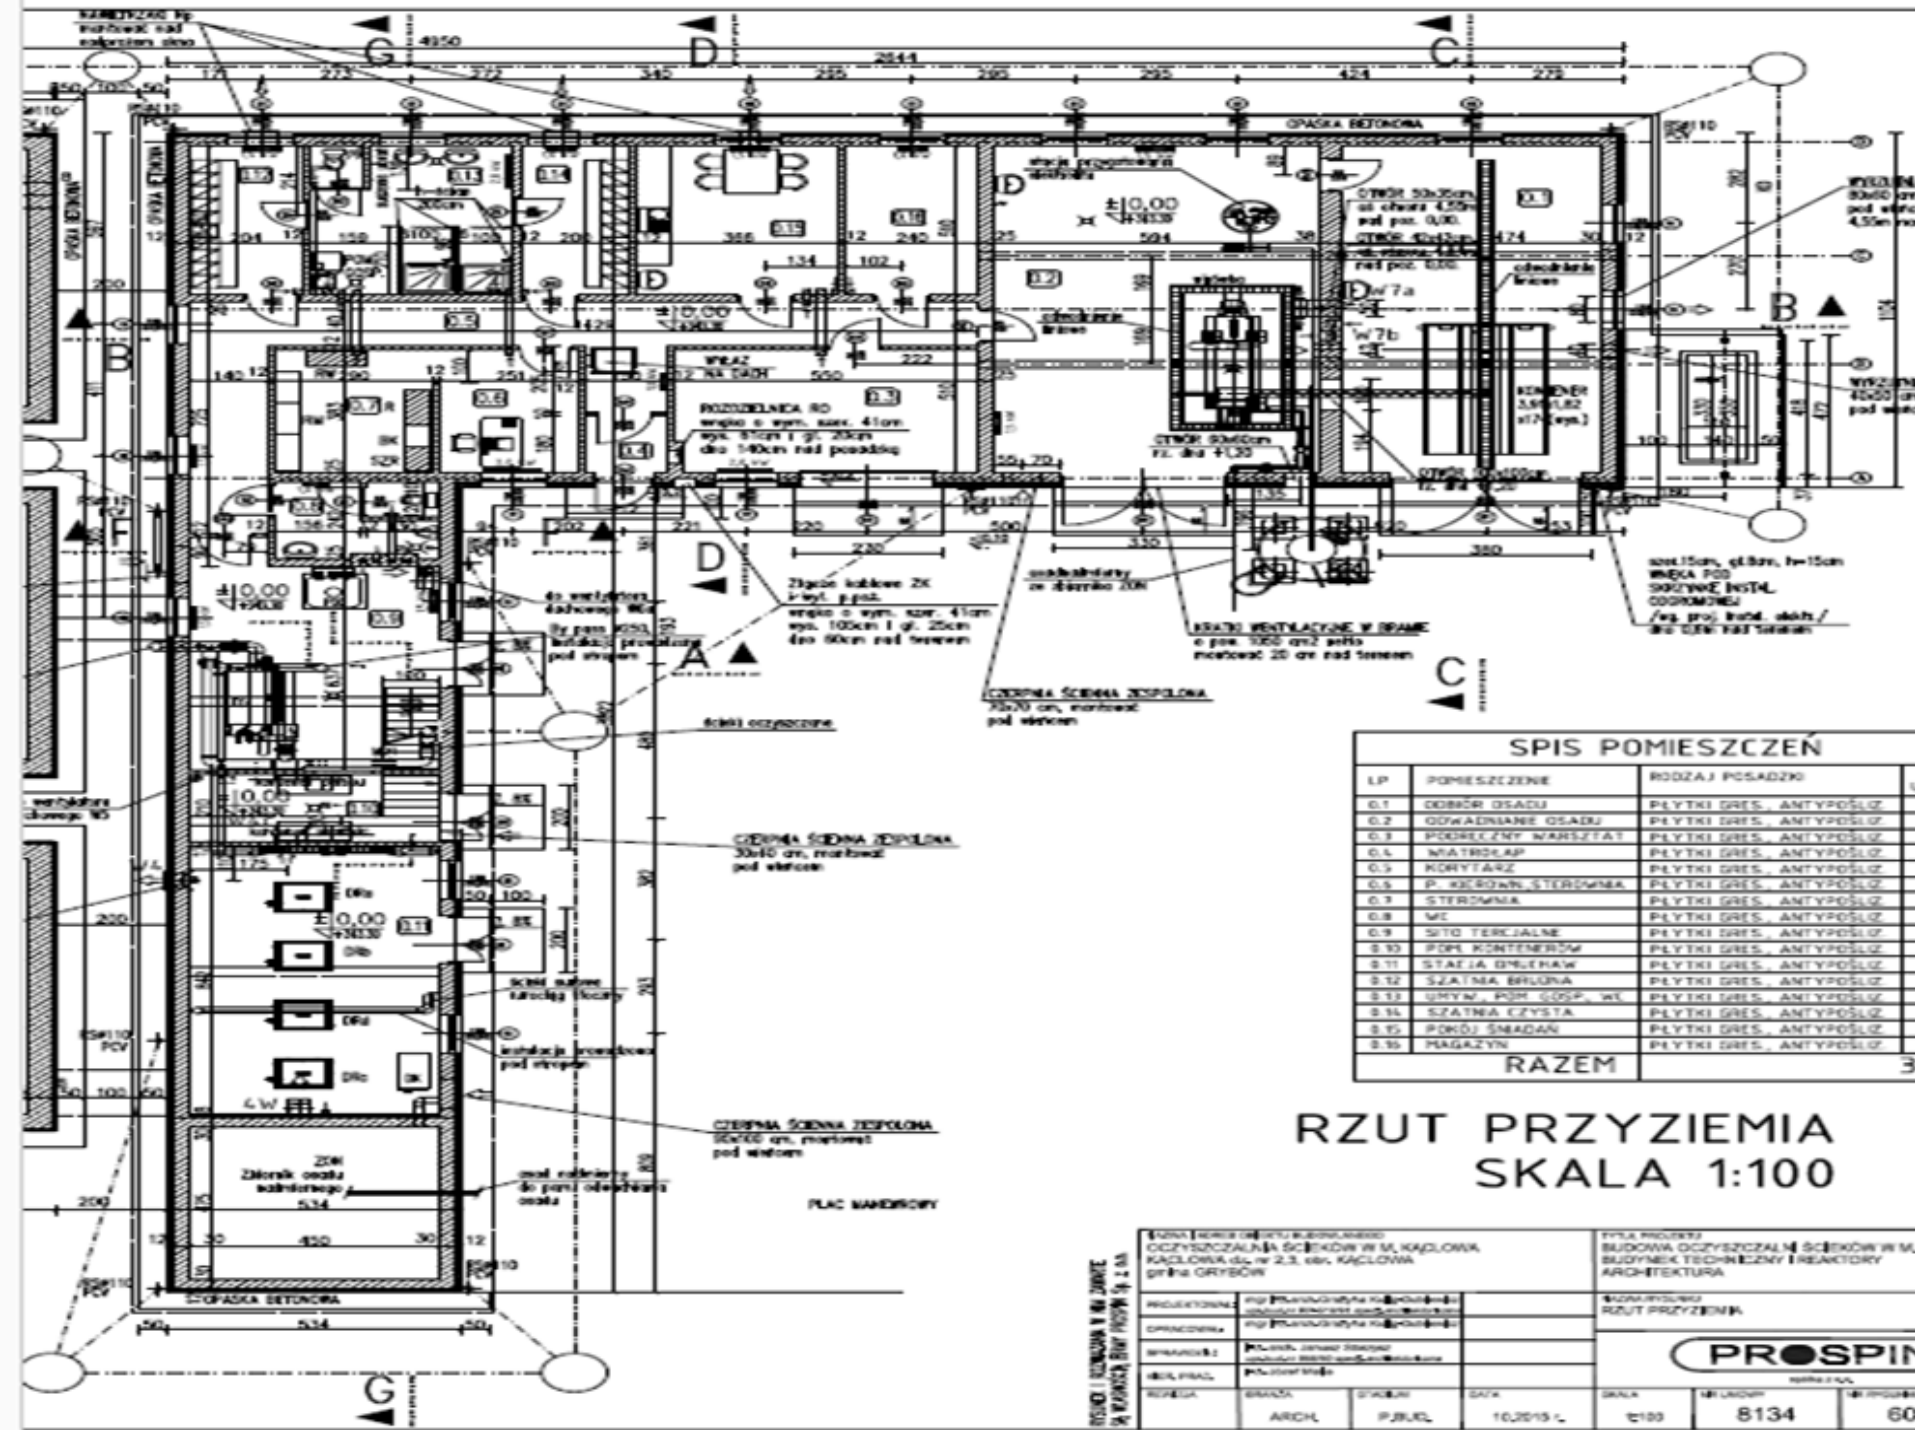

LP	POMIESZCZENIE	RODZAJ POSADZKI	U
0.1	DOBÓR OSADZU	PLYTKI GRES, ANTYPOŚLIZ	
0.2	OGWADNIANE OSADZU	PLYTKI GRES, ANTYPOŚLIZ	
0.3	PODRĘCZNY WARSZTAT	PLYTKI GRES, ANTYPOŚLIZ	
0.4	MATRÓSLAP	PLYTKI GRES, ANTYPOŚLIZ	
0.5	KORYTARZ	PLYTKI GRES, ANTYPOŚLIZ	
0.6	P. KUCHENNA STEROWANA	PLYTKI GRES, ANTYPOŚLIZ	
0.7	STEROWANA	PLYTKI GRES, ANTYPOŚLIZ	
0.8	WC	PLYTKI GRES, ANTYPOŚLIZ	
0.9	SIŁO TERCJALNE	PLYTKI GRES, ANTYPOŚLIZ	
0.10	POP. KONTENERÓW	PLYTKI GRES, ANTYPOŚLIZ	
0.11	STAJA DŁUGA	PLYTKI GRES, ANTYPOŚLIZ	
0.12	SZATNIA BRUŁNA	PLYTKI GRES, ANTYPOŚLIZ	
0.13	UMYW. POPR. GOSP. WC	PLYTKI GRES, ANTYPOŚLIZ	
0.14	SZATNIA CZYSTA	PLYTKI GRES, ANTYPOŚLIZ	
0.15	POKÓJ ŚNIADANI	PLYTKI GRES, ANTYPOŚLIZ	
0.16	MAGAZYN	PLYTKI GRES, ANTYPOŚLIZ	
RAZEM			3

ZADANIE: PROJEKT BUDYNKU BUDOWNICTWA CZYŚCZALNI ŚCIEKÓW W M. KĄCZŁOWA KĄCZŁOWA, UL. W. 2.3. 60. KĄCZŁOWA STR. GRYBÓW				TYTUŁ PROJEKTU: BUDOWA CZYŚCZALNI ŚCIEKÓW W M. BUDYNEK TECHNICZNY I REAKTORY ARCHITEKTURA	
PROJEKCYONISTA:	mgr inż. Andrzej Prospin			BUDOWNICTWO	
OPRACOWANIE:	mgr inż. Andrzej Prospin			RZUT PRZYZIEMIA	
WYKONANIE:	mgr inż. Andrzej Prospin				
REDAKCJA:	ARCH. P.JUKL.	DATA:	10.2015 L.	SKALA:	1:100
				Lp. DOKUM.:	8134
				Lp. STRON.:	60

- nadzór nad budową oczyszczalni ścieków wykonuje: Dom Inżynierski PROMIS ze Szczecina. **Umowa z dnia 28.12.2017 r**
- umowny termin zakończenia budowy oczyszczalni ścieków – **maj 2019**

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kąclowa” – KONTRAKT 2



PODPISANE UMOWY

- **21.02.2018** r. podpisanie umowy z wykonawcą: Zakład Usługowo Produkcyjno Handlowy HAŻBUD Sp. z o.o. z Gorlic za kwotę 8.500.000,00.
- Nadzór nad inwestycją prowadzi NADZÓR BUDOWLANY I PROJEKTOWY MAREK ŻMUDA z Nowego Sącza – umowa z dnia **28.03.2018**
- zadanie obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej o długości 20 km w miejscowości Kąclowa,
- do dnia dzisiejszego wykonano 8 km sieci,
- Umowny termin zakończenia inwestycji: **marzec 2019**

















Zaawansowanie finansowe: 1.225.245,54 zł

„Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Stróże- etap II

- w dniu **17.10.2017 r.** podpisano umowę na rozbudowę oczyszczalni ścieków Stróże.
- Zadanie realizuje firma EKOSERVISPOL Spółka z o.o. z Nowego Targu za kwotę **2.949.540,00 zł**
- W ramach rozbudowy oczyszczalni – etap II został uzbrojony drugi ciąg technologiczny (reaktor).















W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH BASEN

- Budowa zespołu basenów sportowo rekreacyjnych wraz z zespołem saun, salą fitness oraz częścią hotelowo konferencyjną, gastronomiczną i niezbędną infrastrukturą techniczną,
- Budynek trzykondygnacyjny z poddaszem użytkowym i podpiwniczeniem,
- Bryła budynku nawiązuje do tradycyjnej architektury regionalnej

POZIOM PARTERU

- a) Hala basenowa dla 150 użytkowników,
 - Basen sportowy o wymiarach 10,5x18 m – 5 torów,
 - Basen z bąblem wspinaczkowym średnica 5 m,
 - Basen ogólny
 - Basen dla dzieci o zróżnicowanej głębokości z dwoma zjeżdżalniąmi,
 - Basen rekreacyjny wyposażony w masaż do stóp i pleców, dysze wodne powietrzne, gejzery powietrzne, masaż karku, leżaki powietrzne oraz rwąca rzeka,
 - Dwie wanny typu SPA

POZIOM PODDASZA

- Dwie sale konferencyjne dla łącznie 110 osób
- Zaprojektowano 7 apartamentów





Aquapark
Water Park



ZJEŹDŻALNIE

- Budowa zjeżdżalni ze stali nierdzewnej wraz ze ścianką wspinaczkową – lokalizacja Centrum Sportów Zimowych w Ptaszkowej
- Wykonawca zadania P.U.H. MJM-Service, Jarosław Bocian – Malinowice kwota **1.162.350,00 zł**







Dziękujemy za uwagę
